

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : Eandis

Nr teller : 3266 4278
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30/2016/11/14/9

EAN code : NIC

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. ☐
Genre de contrôle : RGIE ART		☐	☒	☐	☐	☐		

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : Koning Albertstraat 52 1785 Merelbeke

Eigenaar : Van Nolle
Propriétaire : Van Nolle Adres : Koning Albertstr 52 1785 Merelbeke
Adresse :

Installateur : Eigenaar BTW / TVA : NIC
Datum van het onderzoek : Ik. / C.I. : NIC
Date du contrôle : 14/11/2016 Inspecteur : T. Kanan M.

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : 1N200V Meter / bord verbinding : XVB 4x10mm² Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Aardpaal Isolatie : 25 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 20 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>B-4</u>		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre de circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>Algemeen kringen B-4</u>		☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>bykomende 18 S-4</u>		☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : Geen tekorten vastgesteld

VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het éénraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : 21-11-2017

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur : [Signature]

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK 18 m	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☒	☐	☒	 /
271 AK	☐	271 HK	☐	 /
276 AK	☐	276 HK	☐	 /

Rapport des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'intervention dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et aux biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme agité afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agité se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

ET
Meyn
14-11-2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I
DIFF.	KOOKPLAAT	OVEN	COMBI OVEN	KOELKAST + DAMPKAP	KRING 1 (keuken)	KRING 2 (zoldergord.)	KRING 3 (bergevel)	KRING 4 (gang + kelder)
300 mA	32 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A

J	K	L	M	N	O	P	Q
KRING 5 (muis midden)	KRING 6 (zolder)	KRING 7 (garage)	KRING 8 (vollede zolder)	ROLLUIKEN	LICHT I	LICHT II	LICHT III
20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	16 A	16 A	16 A

R	S	T	U	V	W	X	Y
DIFF.	WM	DROOGKAST	VAATWAS	POMP + ONTKALKER	CV	KOT	BADKAMER
30 mA	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	16 A

TRANSFO BEL							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Overzicht zekeringen

Zekering A	Differentieel	300 mA	VOB 6
Zekering B	Kookplaat	32 A	VOB 6
Zekering C	Combi oven	20 A	VOB 2,5
Zekering D	Oven	20 A	VOB 2,5
Zekering E	Koelkast + dampkap	20 A	VOB 2,5
Zekering F	Kring 1 (keuken)	20 A	VOB 2,5
Zekering G	Kring 2 (woonkamer muur tuin en garage)	20 A	VOB 2,5
Zekering H	Kring 3 (voorgevel vpls en slaapkamer)	20 A	VOB 2,5
Zekering I	Kring 4 (gang + kelder)	20 A	VOB 2,5
Zekering J	Kring 5 (muur tussen vpls en living)	20 A	VOB 2,5
Zekering K	Kring 6 (zolder en gemene muur slpk 1 en 2)	20 A	VOB 2,5
Zekering L	Kring 7 (garage)	20 A	VOB 2,5
Zekering M	Kring 8 (rolluiken zolder)	20 A	VOB 2,5
Zekering N	Kring 9 (rolluiken)	20 A	VOB 2,5
Zekering O	Licht I	16 A	VOB 1,5
Zekering P	Licht II	16 A	VOB 1,5
Zekering Q	Licht III	16 A	VOB 1,5
Zekering R	Differentieel	30 mA	
Zekering S	Wasmachine	20 A	VOB 2,5
Zekering T	Droogkast	20 A	VOB 2,5
Zekering U	Vaatwas	20 A	VOB 2,5
Zekering V	Pomp + waterontkalker	20 A	VOB 2,5
Zekering W	Ketel CV	20 A	VOB 2,5
Zekering X	Kot (voeding)	20 A	VOB 2,5
Zekering Y	Badkamer	16 A	VOB 2,5

ET




Kringlopen licht

Licht I:	Werktafel keuken (wissel)
	Eettafel keuken (wissel)
	Wasplaats
	WC
	Buitenverlichting (wissel)
	Garage (wissel)

Licht II:	Gang beneden + overloop (wissel)
	Trap zolder (wissel)
	Zolder (plafond)
	Zolder (muur)
	Slaapkamer 1 (straat)
	Slaapkamer 2 (tuin)

Licht III:	Voorplaats
	Living - plafond (wissel)
	Living - wandverlichting (wissel)
	Kelder


ET

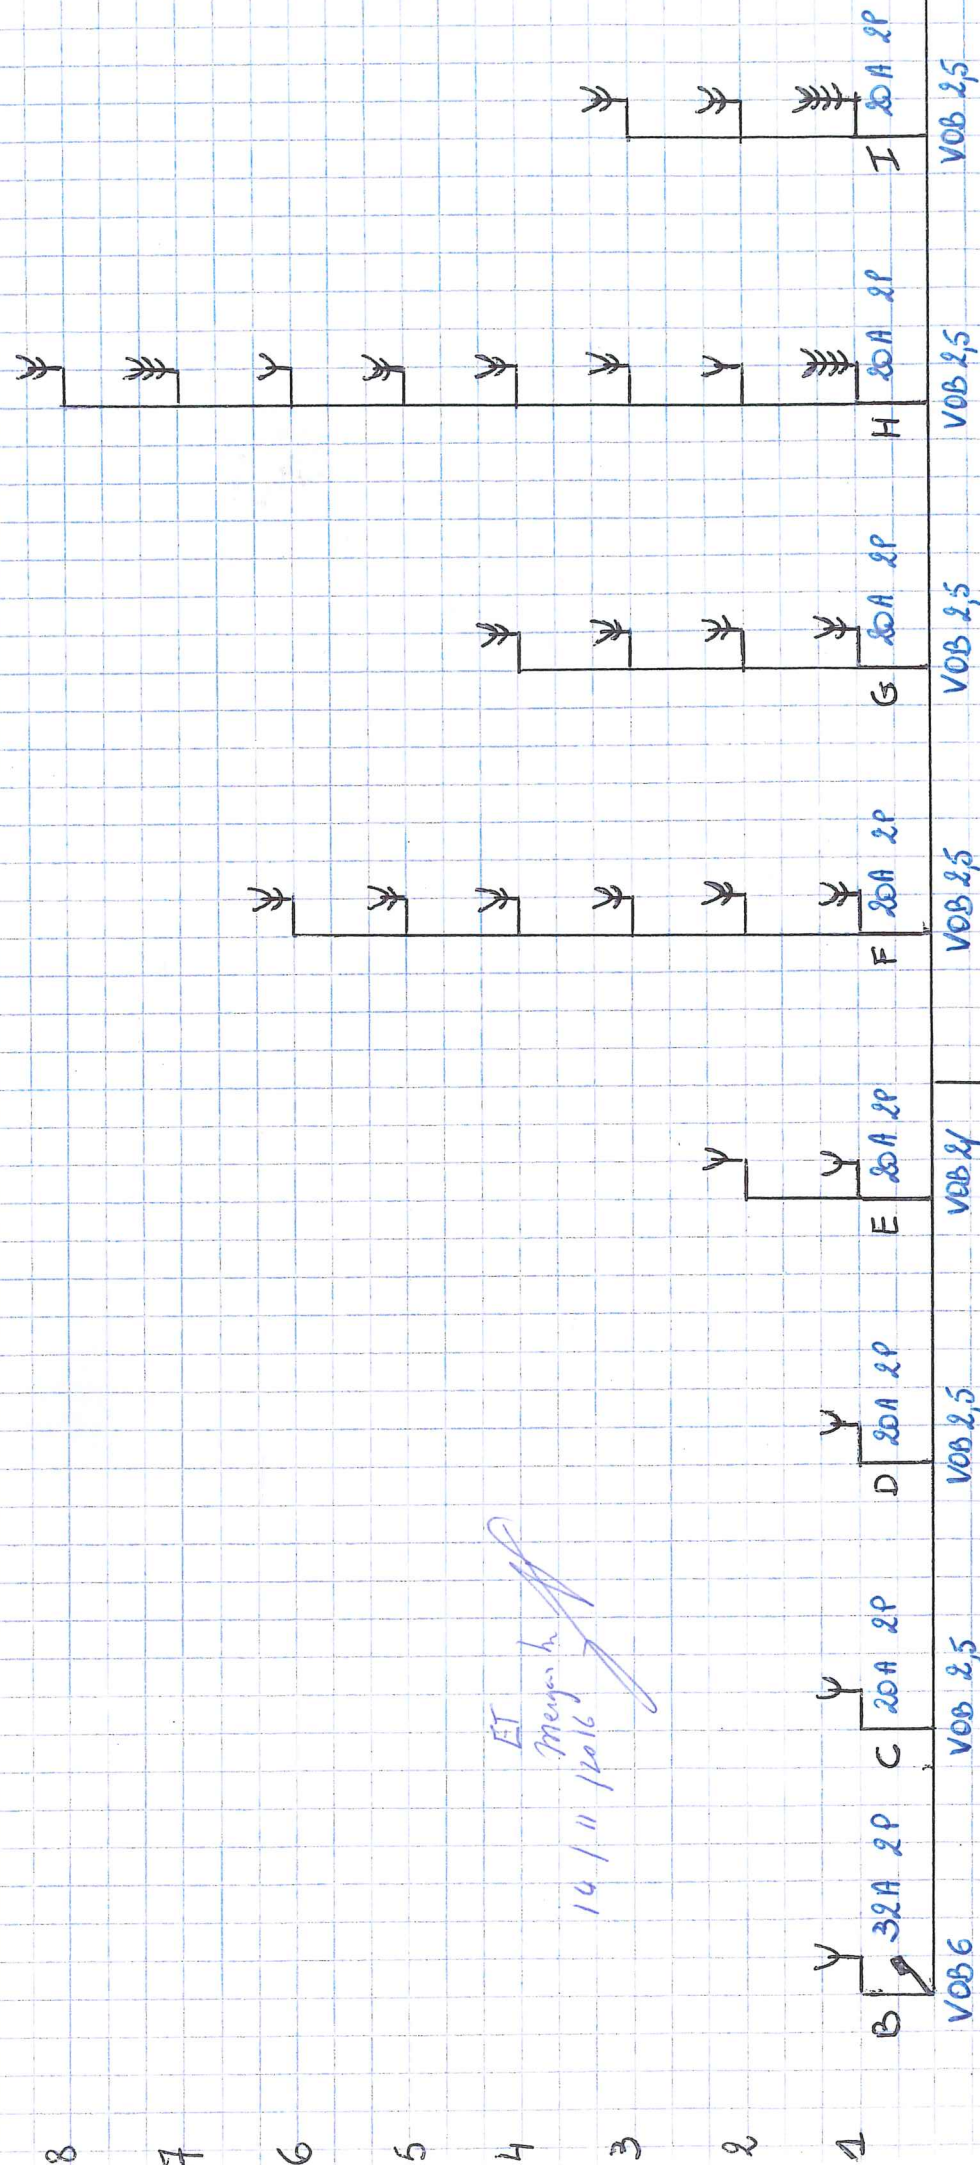

Installatie doc:

U = 240V

Mathias Pan / nelle
Koning Albertstraat 52, Aachen

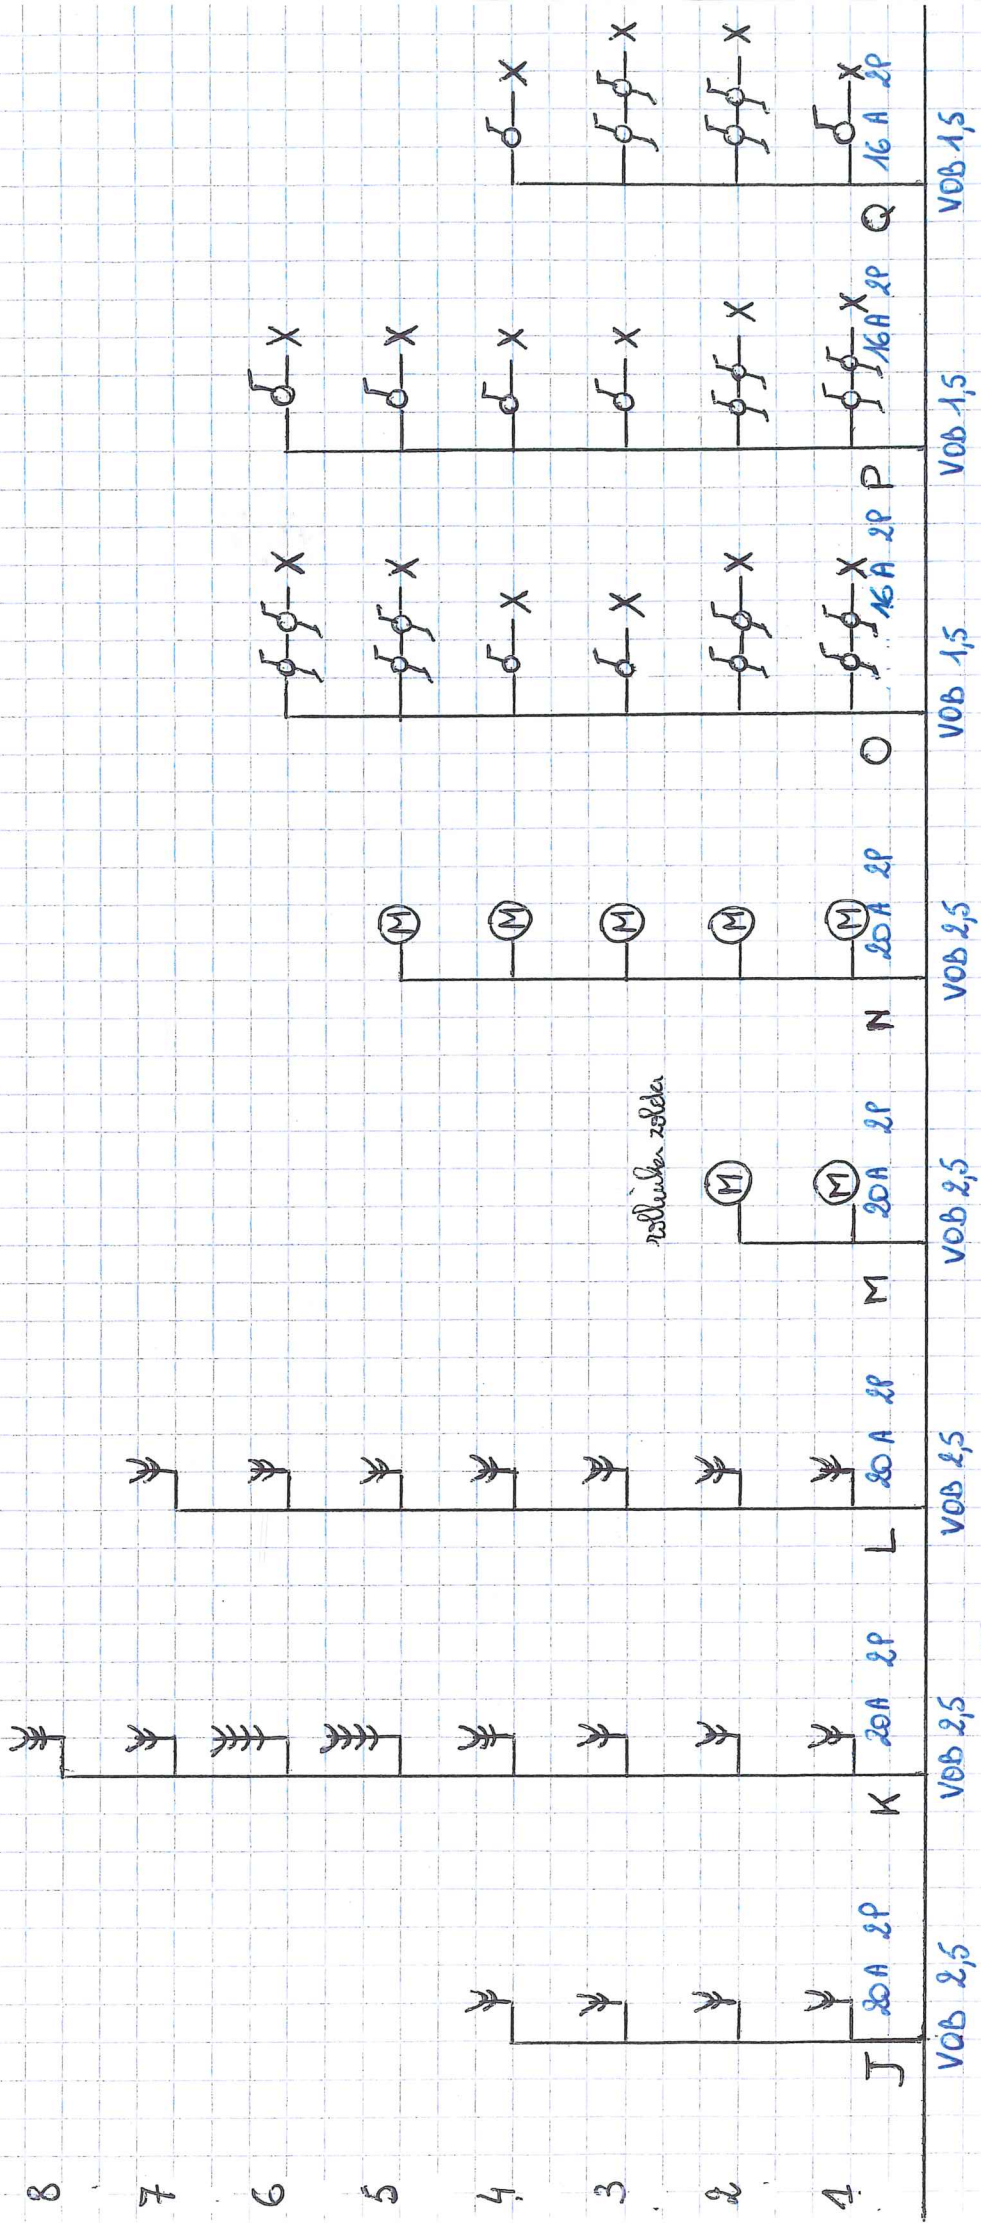

Installatie door:
Mathias Tan / nolle

$$U = 240V$$

Mathias Tan / nolle
Koning Albertstraat 52, Mechelen

8

7

6


5

4

3

2

1

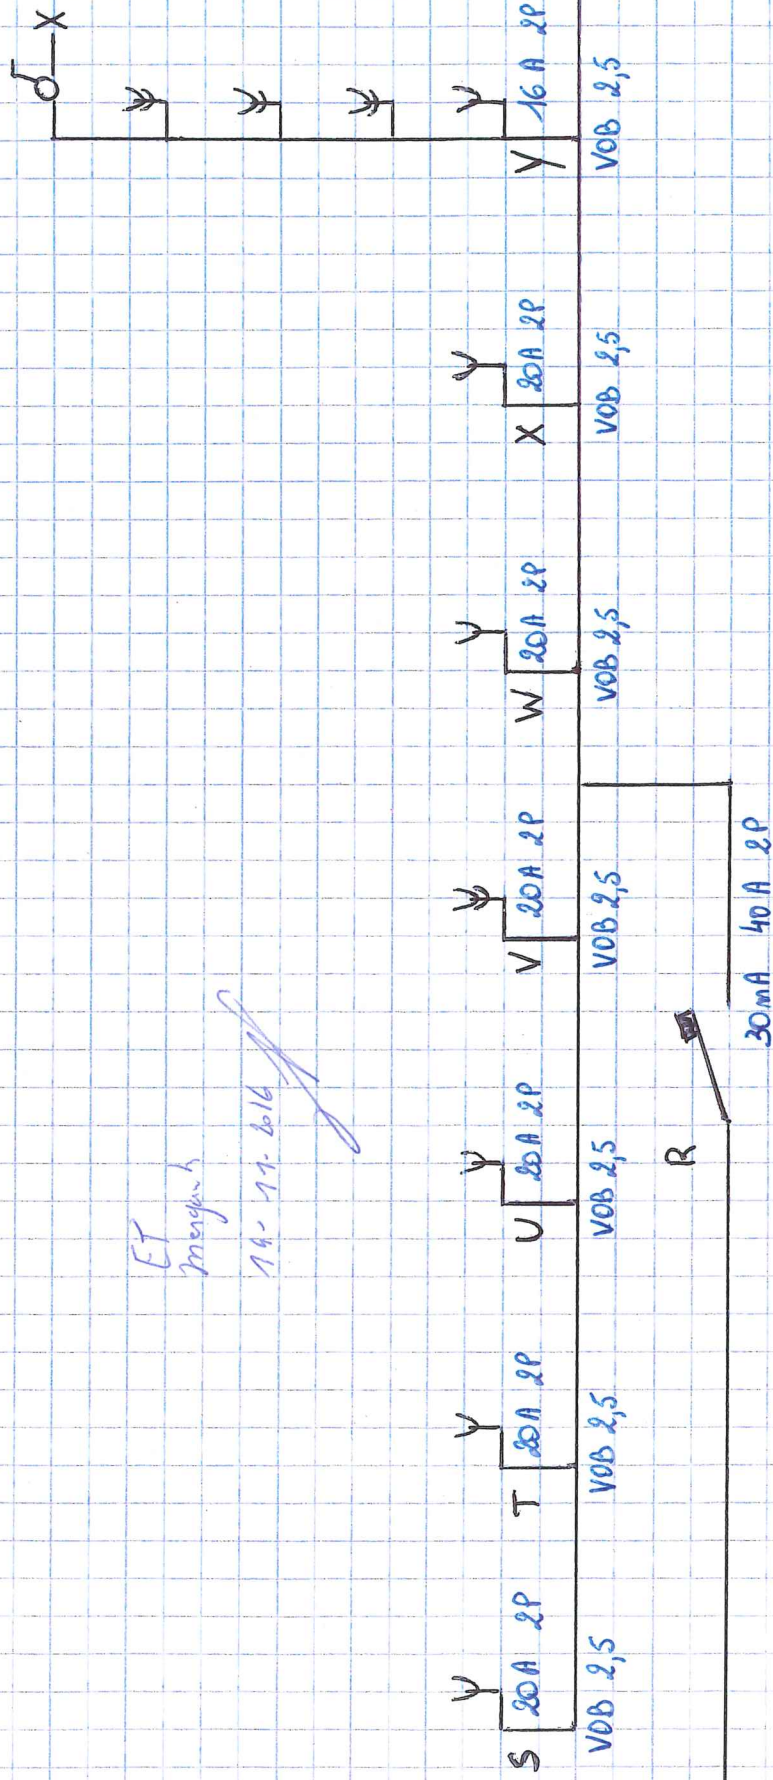



Mathias van Nolle


Koning Albertstraat 52, Nieuw-
Amsterdam

$U = 240V$

Installatie door:
Mathias van Nolle

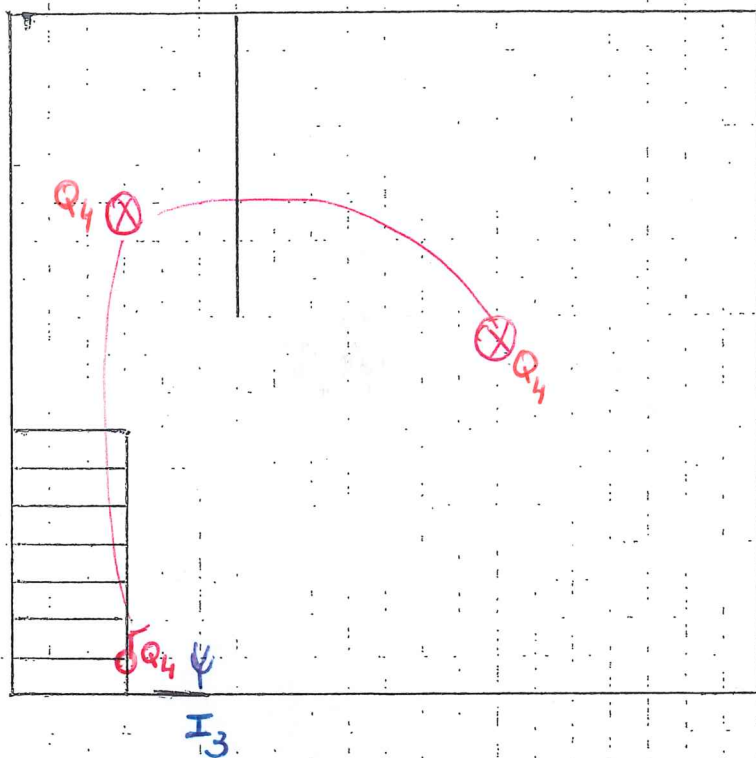

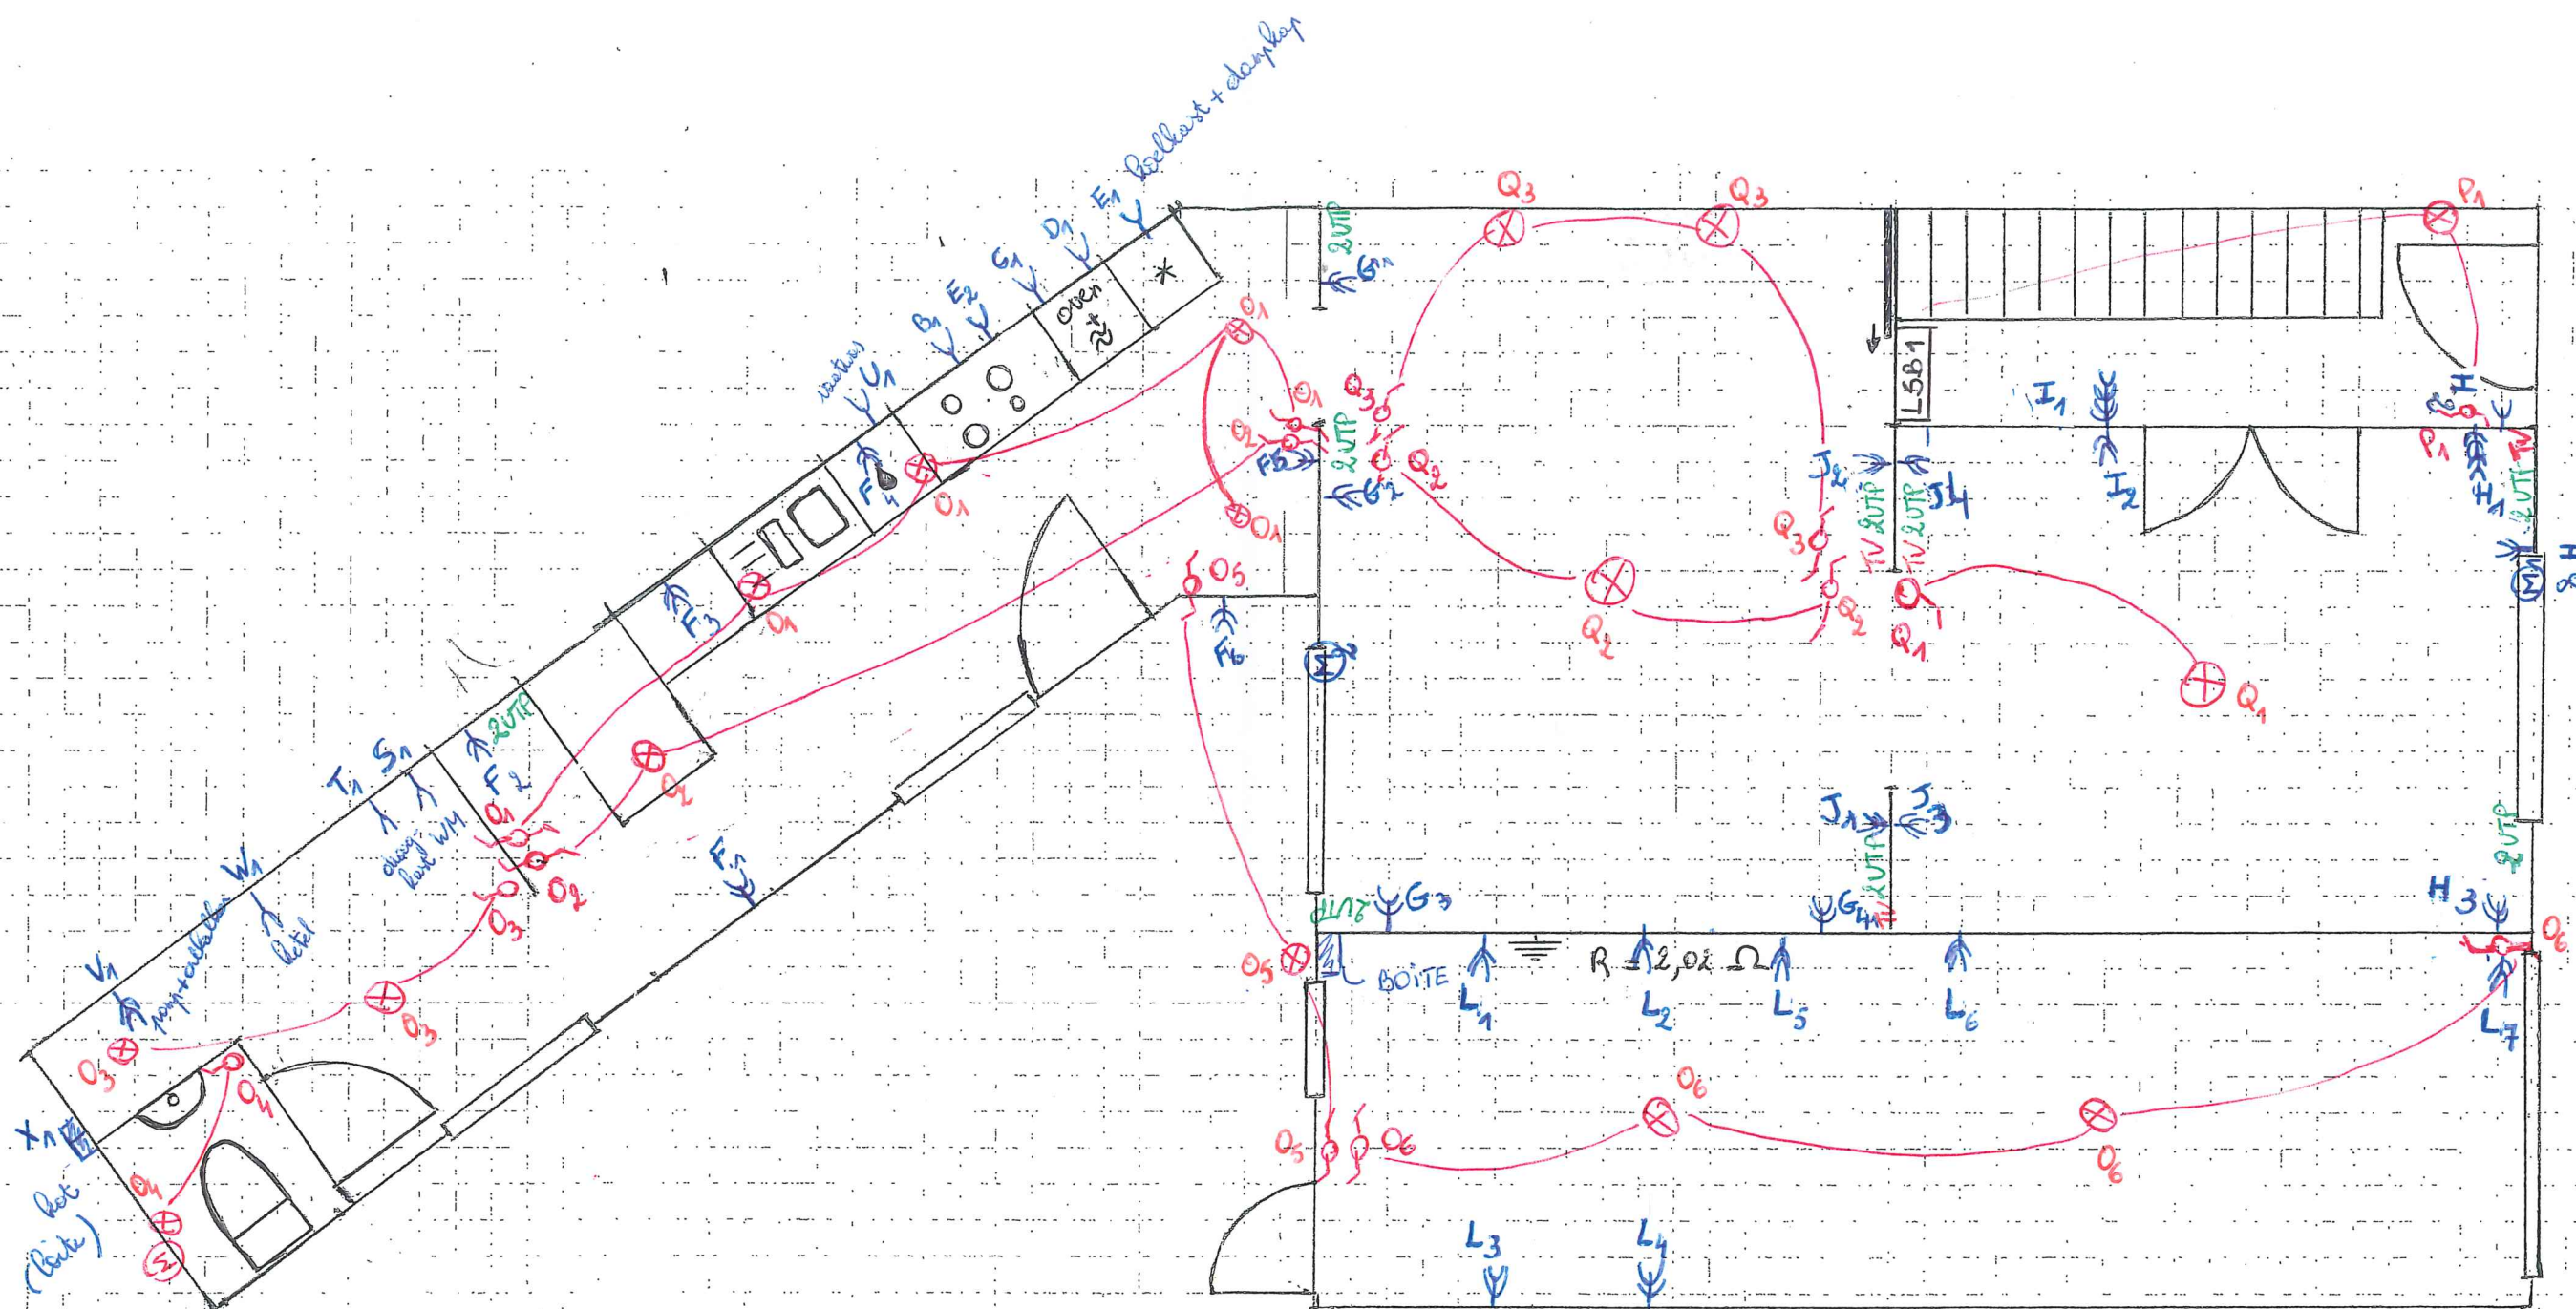

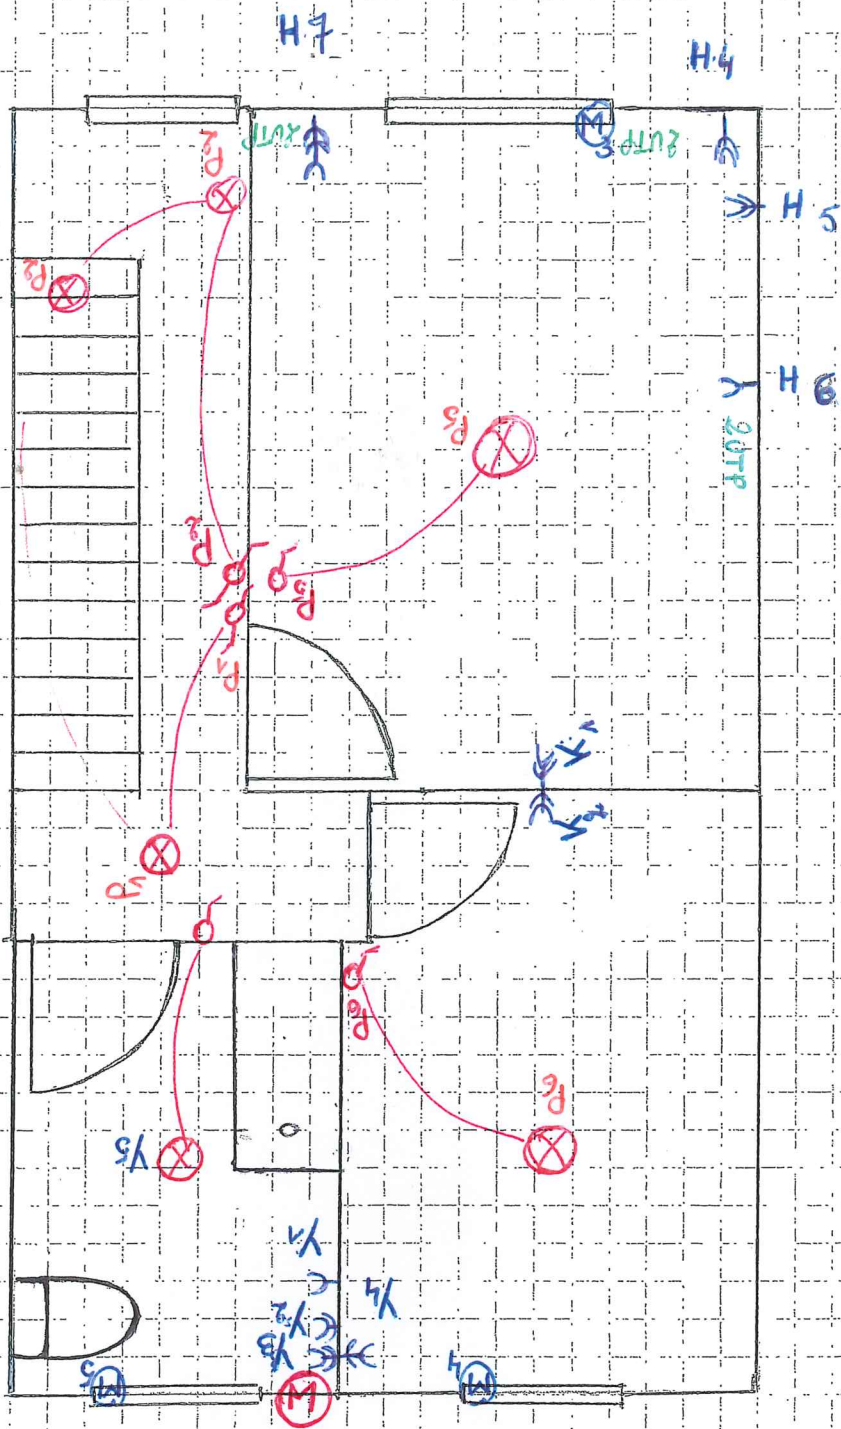

DATE () / () / ()

