

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/09/2026

Inspecteur: Roel De Boeck

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
MI3155

Serienummer: 21251272

Datum verslag: 30/09/2026

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2512038

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Sint-Jansstraat
Huisnummer 93
Busnummer
Postcode 1785
Gemeente Merchtem
Land België

Eigenaar

Naam LATTE Dirk
Straatnaam Sint-Jansstraat
Huisnummer 93
Busnummer
Postcode 1785
Gemeente MERCHTEM
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820061042665

Teller Nr. : 1SAG1200332306



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Aantal kringen: 18

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 232 MΩ

RE: 3,57 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N12 De elektrische installatie was niet volledig toegankelijk, wij hadden geen toegang tot bewoond en bemeubeld volgende lokalen:

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N23 Alle differentieelstroombeschermingsinrichtingen werden getest en in orde bevonden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/9/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:00 tot 09:10

De inspecteur Roel De Boeck

Roel De Boeck
ACEG VZW - #271

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/9/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



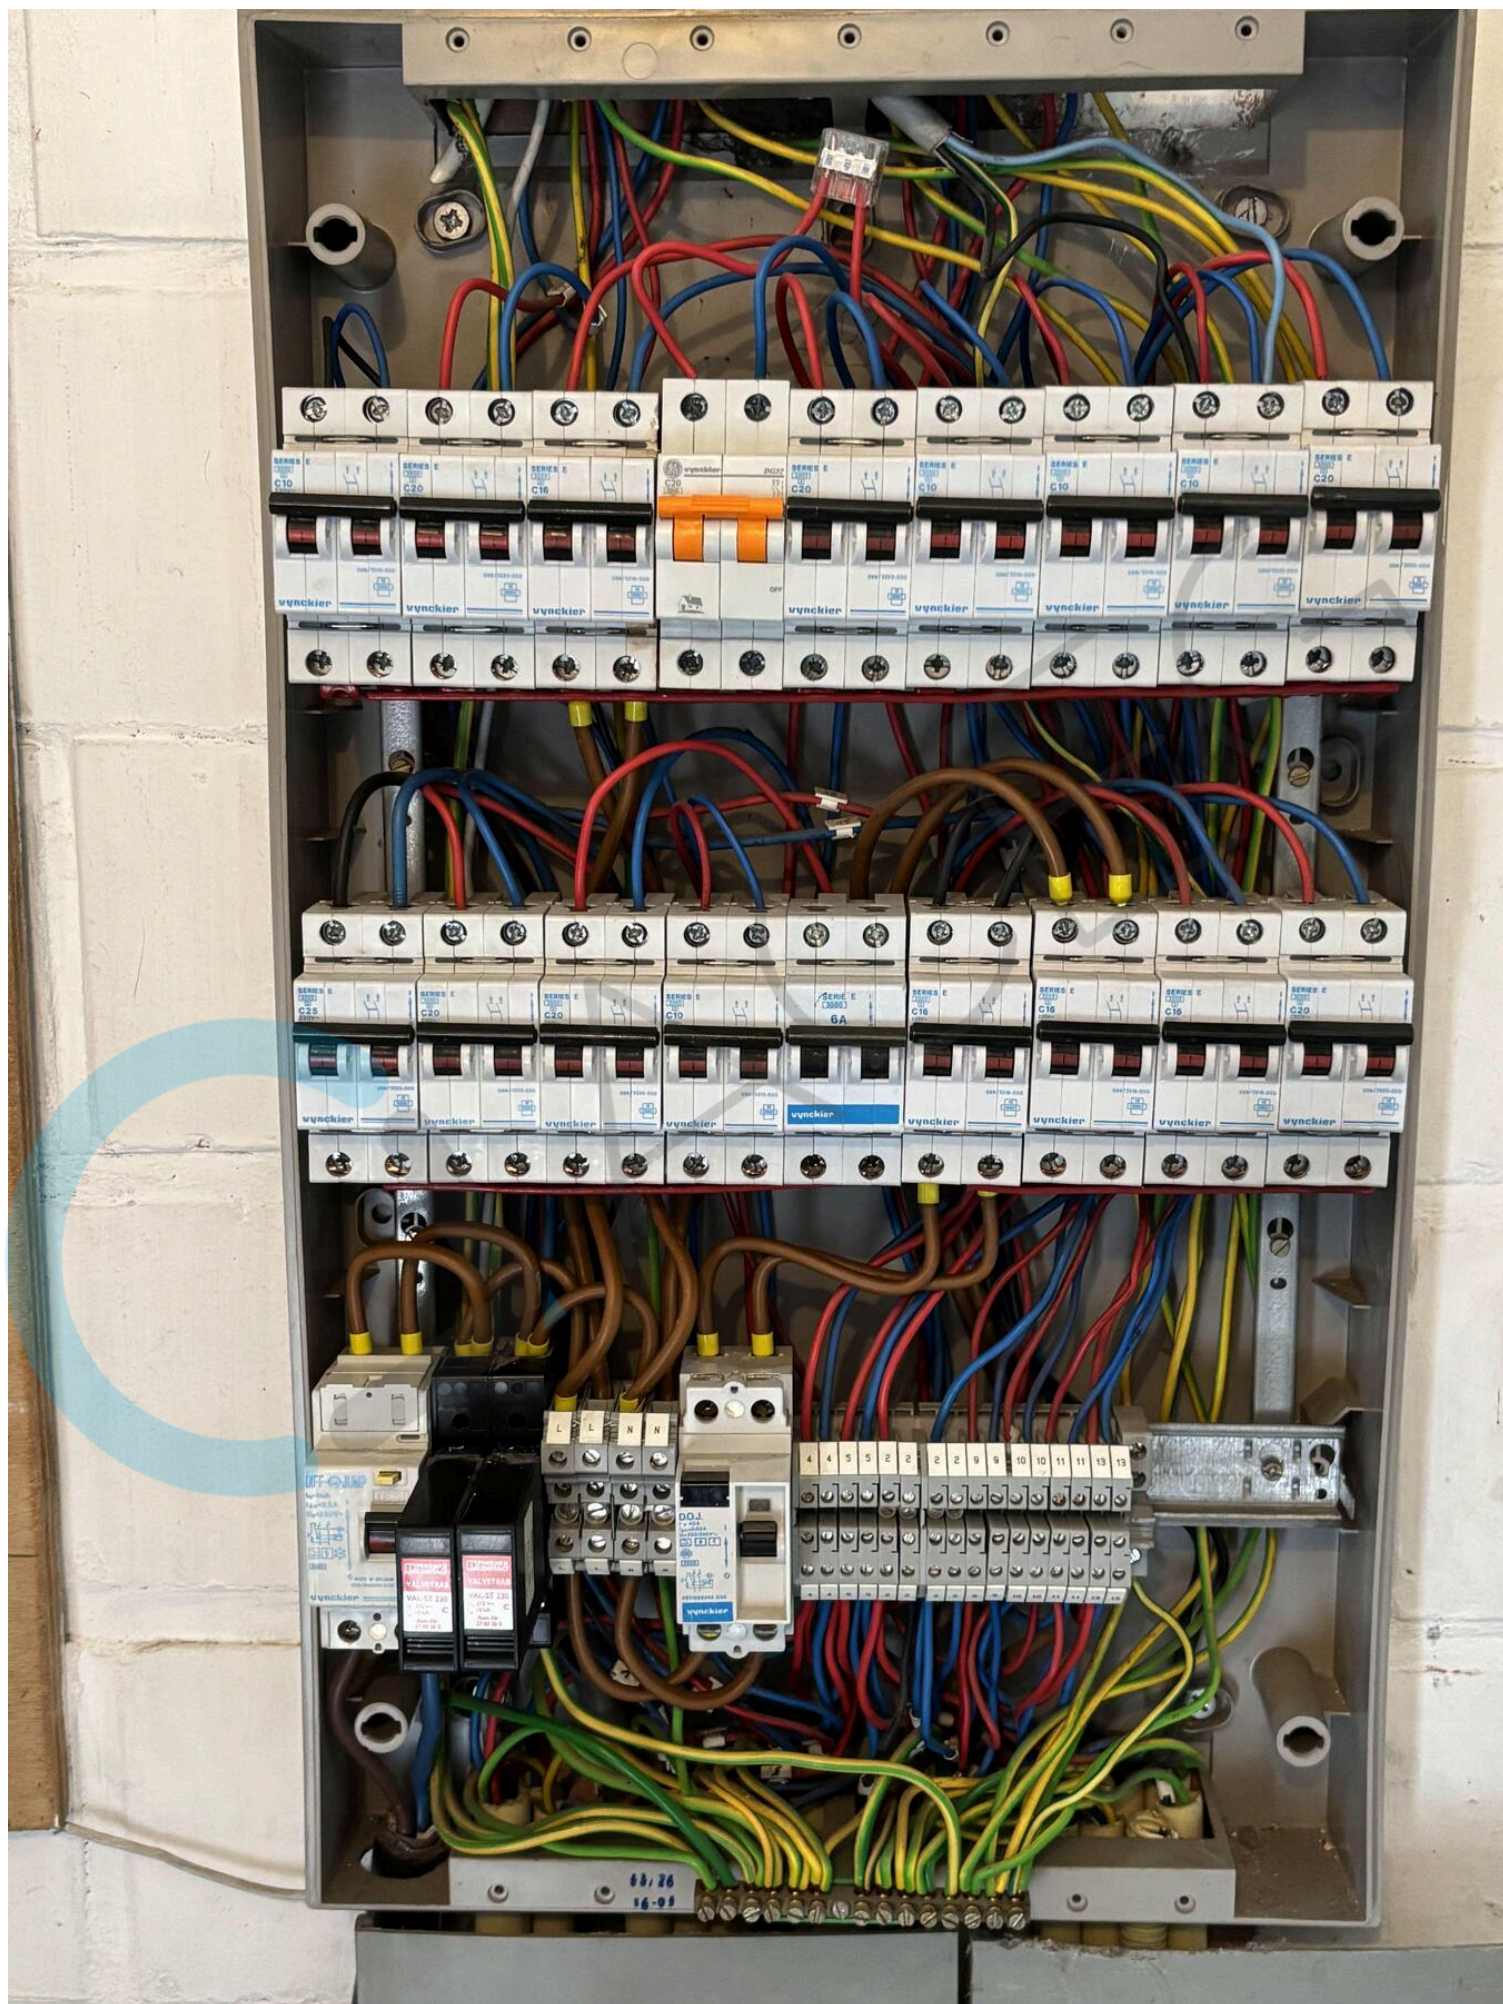

150
FAKORAL



ELECTRO-TEST

OPLEIDINGSCENTRALE V.Z.W.
CENTRE DE FORMATION ASBL

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Herkstraat 35
1820 Melsbroek

Stroomleverende mltj : *Electra* Nr teller : *1*
Cie d'électricité : N° comp : *04/00461* Index : *1*

Proces verbaal van onderzoek
Procès-verbal de contrôle

N° : *04/00461*

Aard onderzoek : AREI art. 270 271 276	TT TN IT	Voorsch. stroomlev. Prescriptie de la cie d'électricité	AREI art. 86 87 88
Genre de contrôle : ☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☒	RGEI ☒ ☐ ☐
Tijdelijk : ☐ Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : ☐ Install. Foraine : ☐	Indienststelling : ☒ Mise en service : ☐	Uitbreiding : ☐ Extension : ☐
			Vernieuwing : ☐ Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek : *St Yankast 95-1885 Mershem*
Situé à :
Eigenaar : *M. Ste Die*
Propriétaire : *16/9/88, Opwijk*
Installateur : *10/04/92*
Datum van het onderzoek : *1/4/94*
Date du contrôle :
Onderzoeker : *Van Lint*
Contrôleur :

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.	Spanning : <i>230V</i> Meter / bord verbinding : <i>EVAUB 4x10</i> Max. beveiliging : <i>50A</i>
Aardelektrode : <i>1.6</i> Ohm Electrode de terre : <i>1.6</i> Ohm	Isolatie : <i>∞</i> Mohm Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Prot. maximale :	

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels				type	Beschermde kringen - Circuits protégés : <i>14</i>
In (A)	Icc (A)	ΔIn (mA)			
<i>40A</i>	<i>3000</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>algemeen II</i>	
				<i>van 1 tot 13</i>	
<i>40A</i>	<i>3000</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>van 14 tot 14</i>	

Opmerkingen / Remarques :

Besluit / Conclusion

De installatie is — *niet* — conform met het AREI en mag — *niet* — tijdelijk — in dienst gesteld worden.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het éénadradsschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont signés.
Het controlebezoek voorzien door art. 271-274 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : *01/06/2019*
L'inspection prévue par l'art. 271-274 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
voor de technisch directeur, de onderzoeker: *1/2/94*
pour le directeur technique, le contrôleur:

VERLEK
M. Sacréstaat 23
1785 MERCHTEM
tel 052/87.87.87

NOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 838 1b v/h APAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de aanschaffende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS: Krachtens het AREI bent u verplicht: 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier.
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 838 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Enlèvement des lieux de travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES: Conformément au RGIE vous êtes tenu: 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique.
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "Énergie Électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.


B.T.W. TVA : BE 434.433.603

ARGENTA : 979-3815191-89

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09




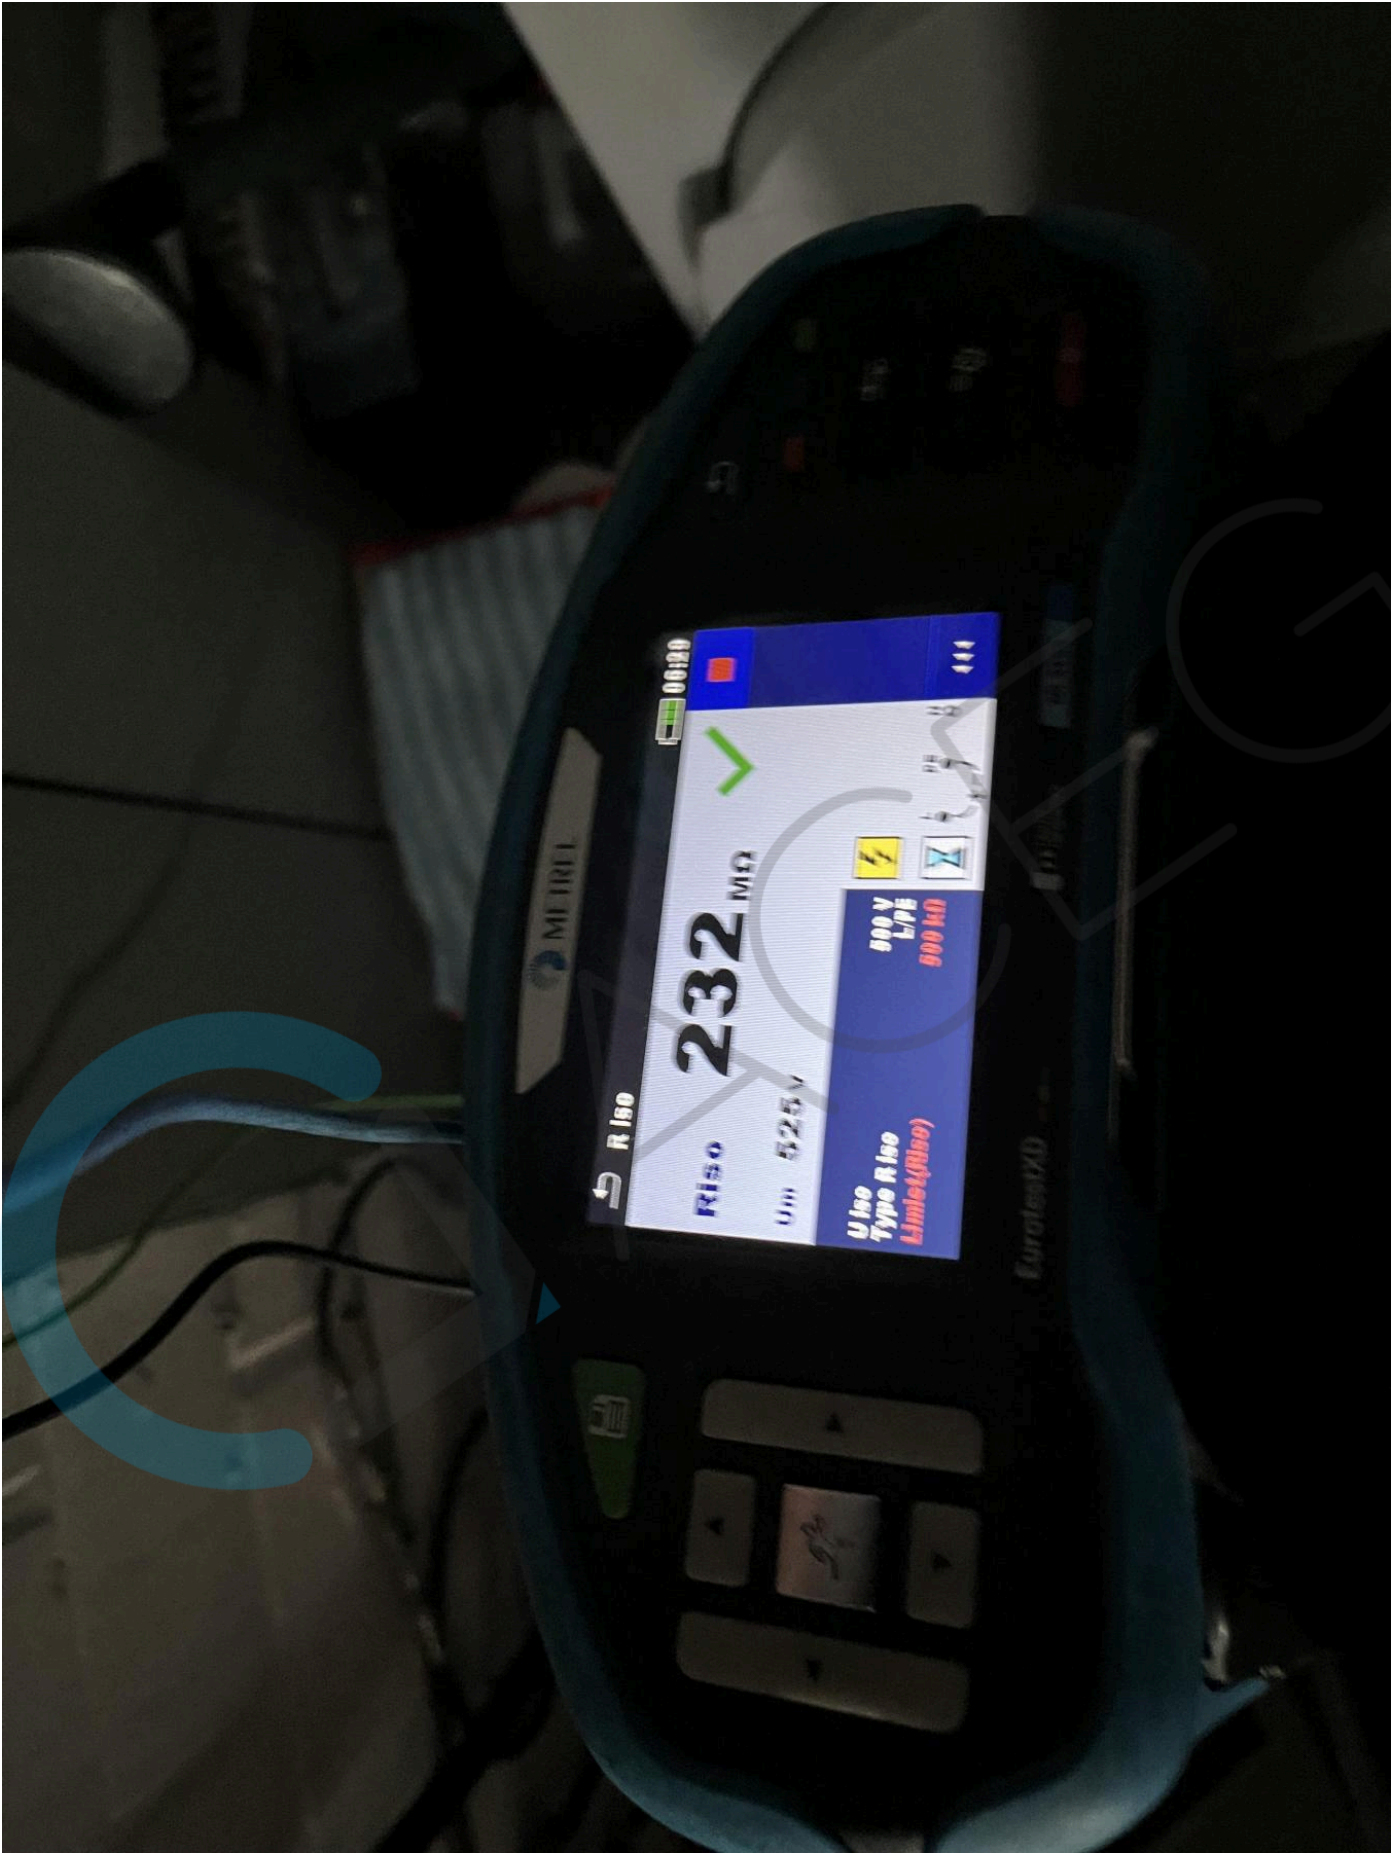









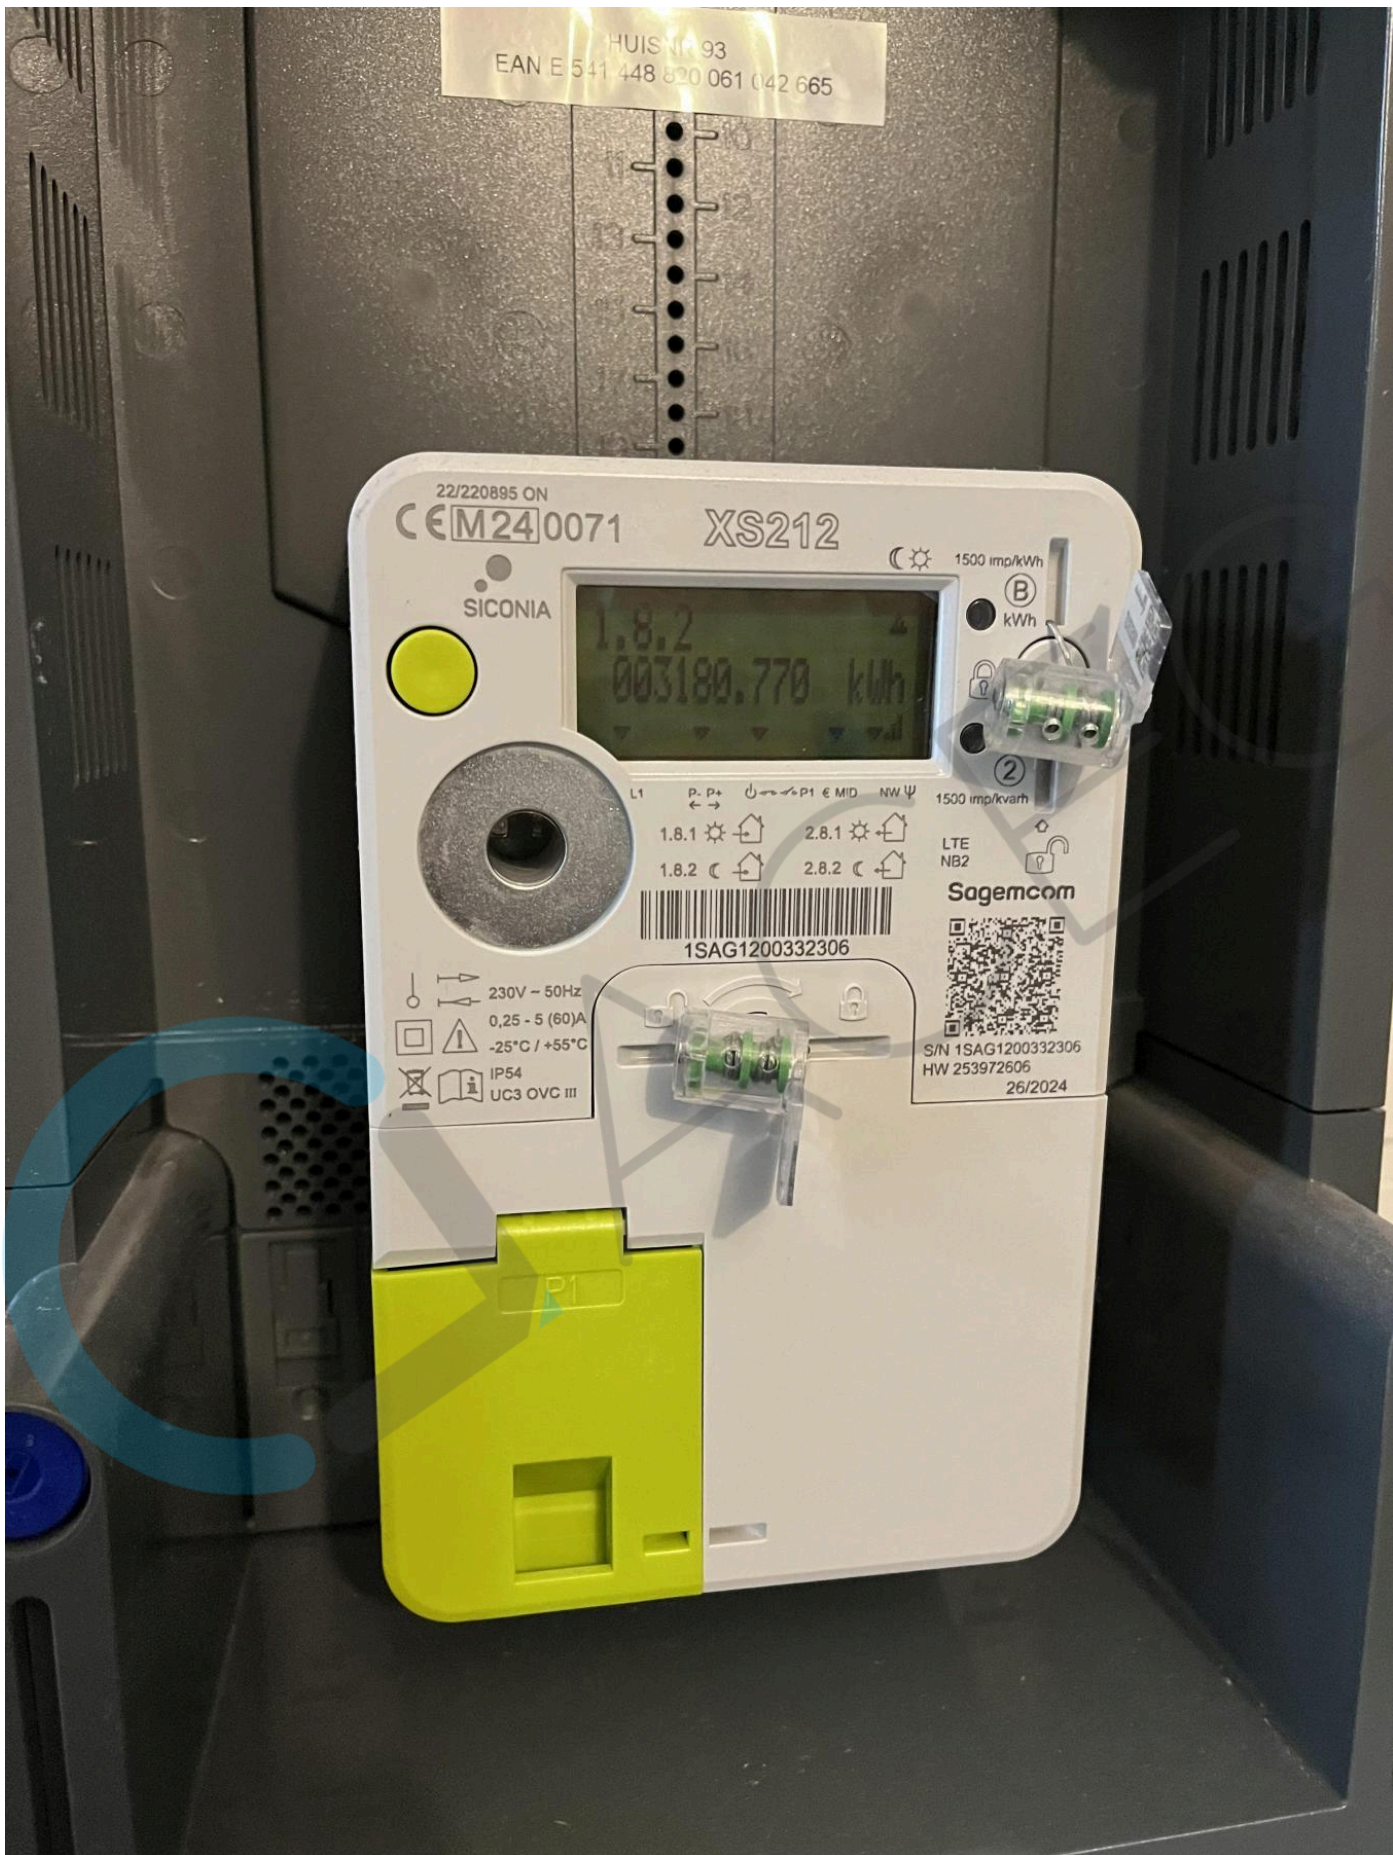



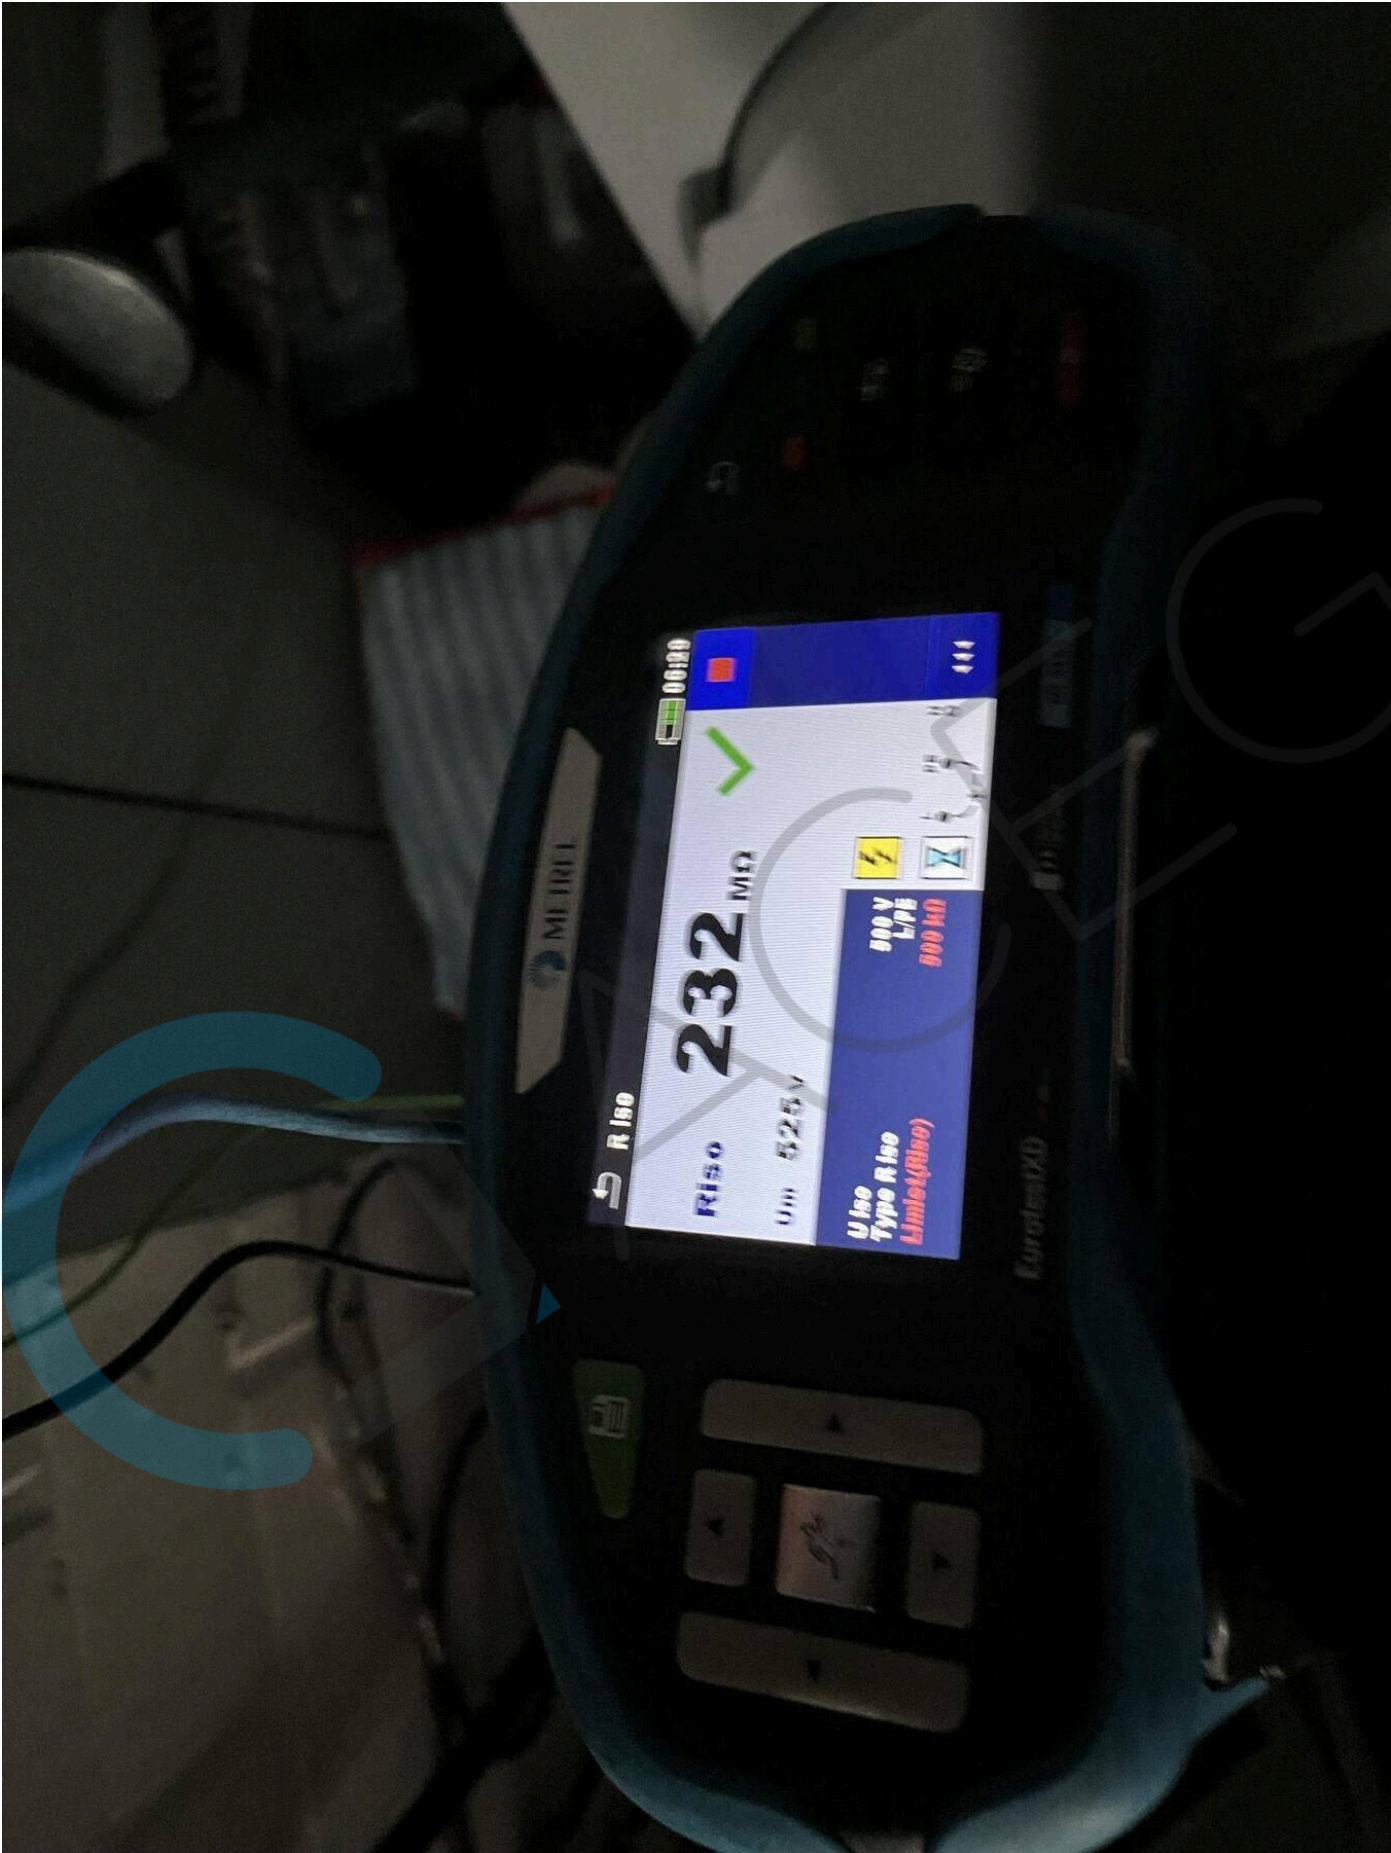

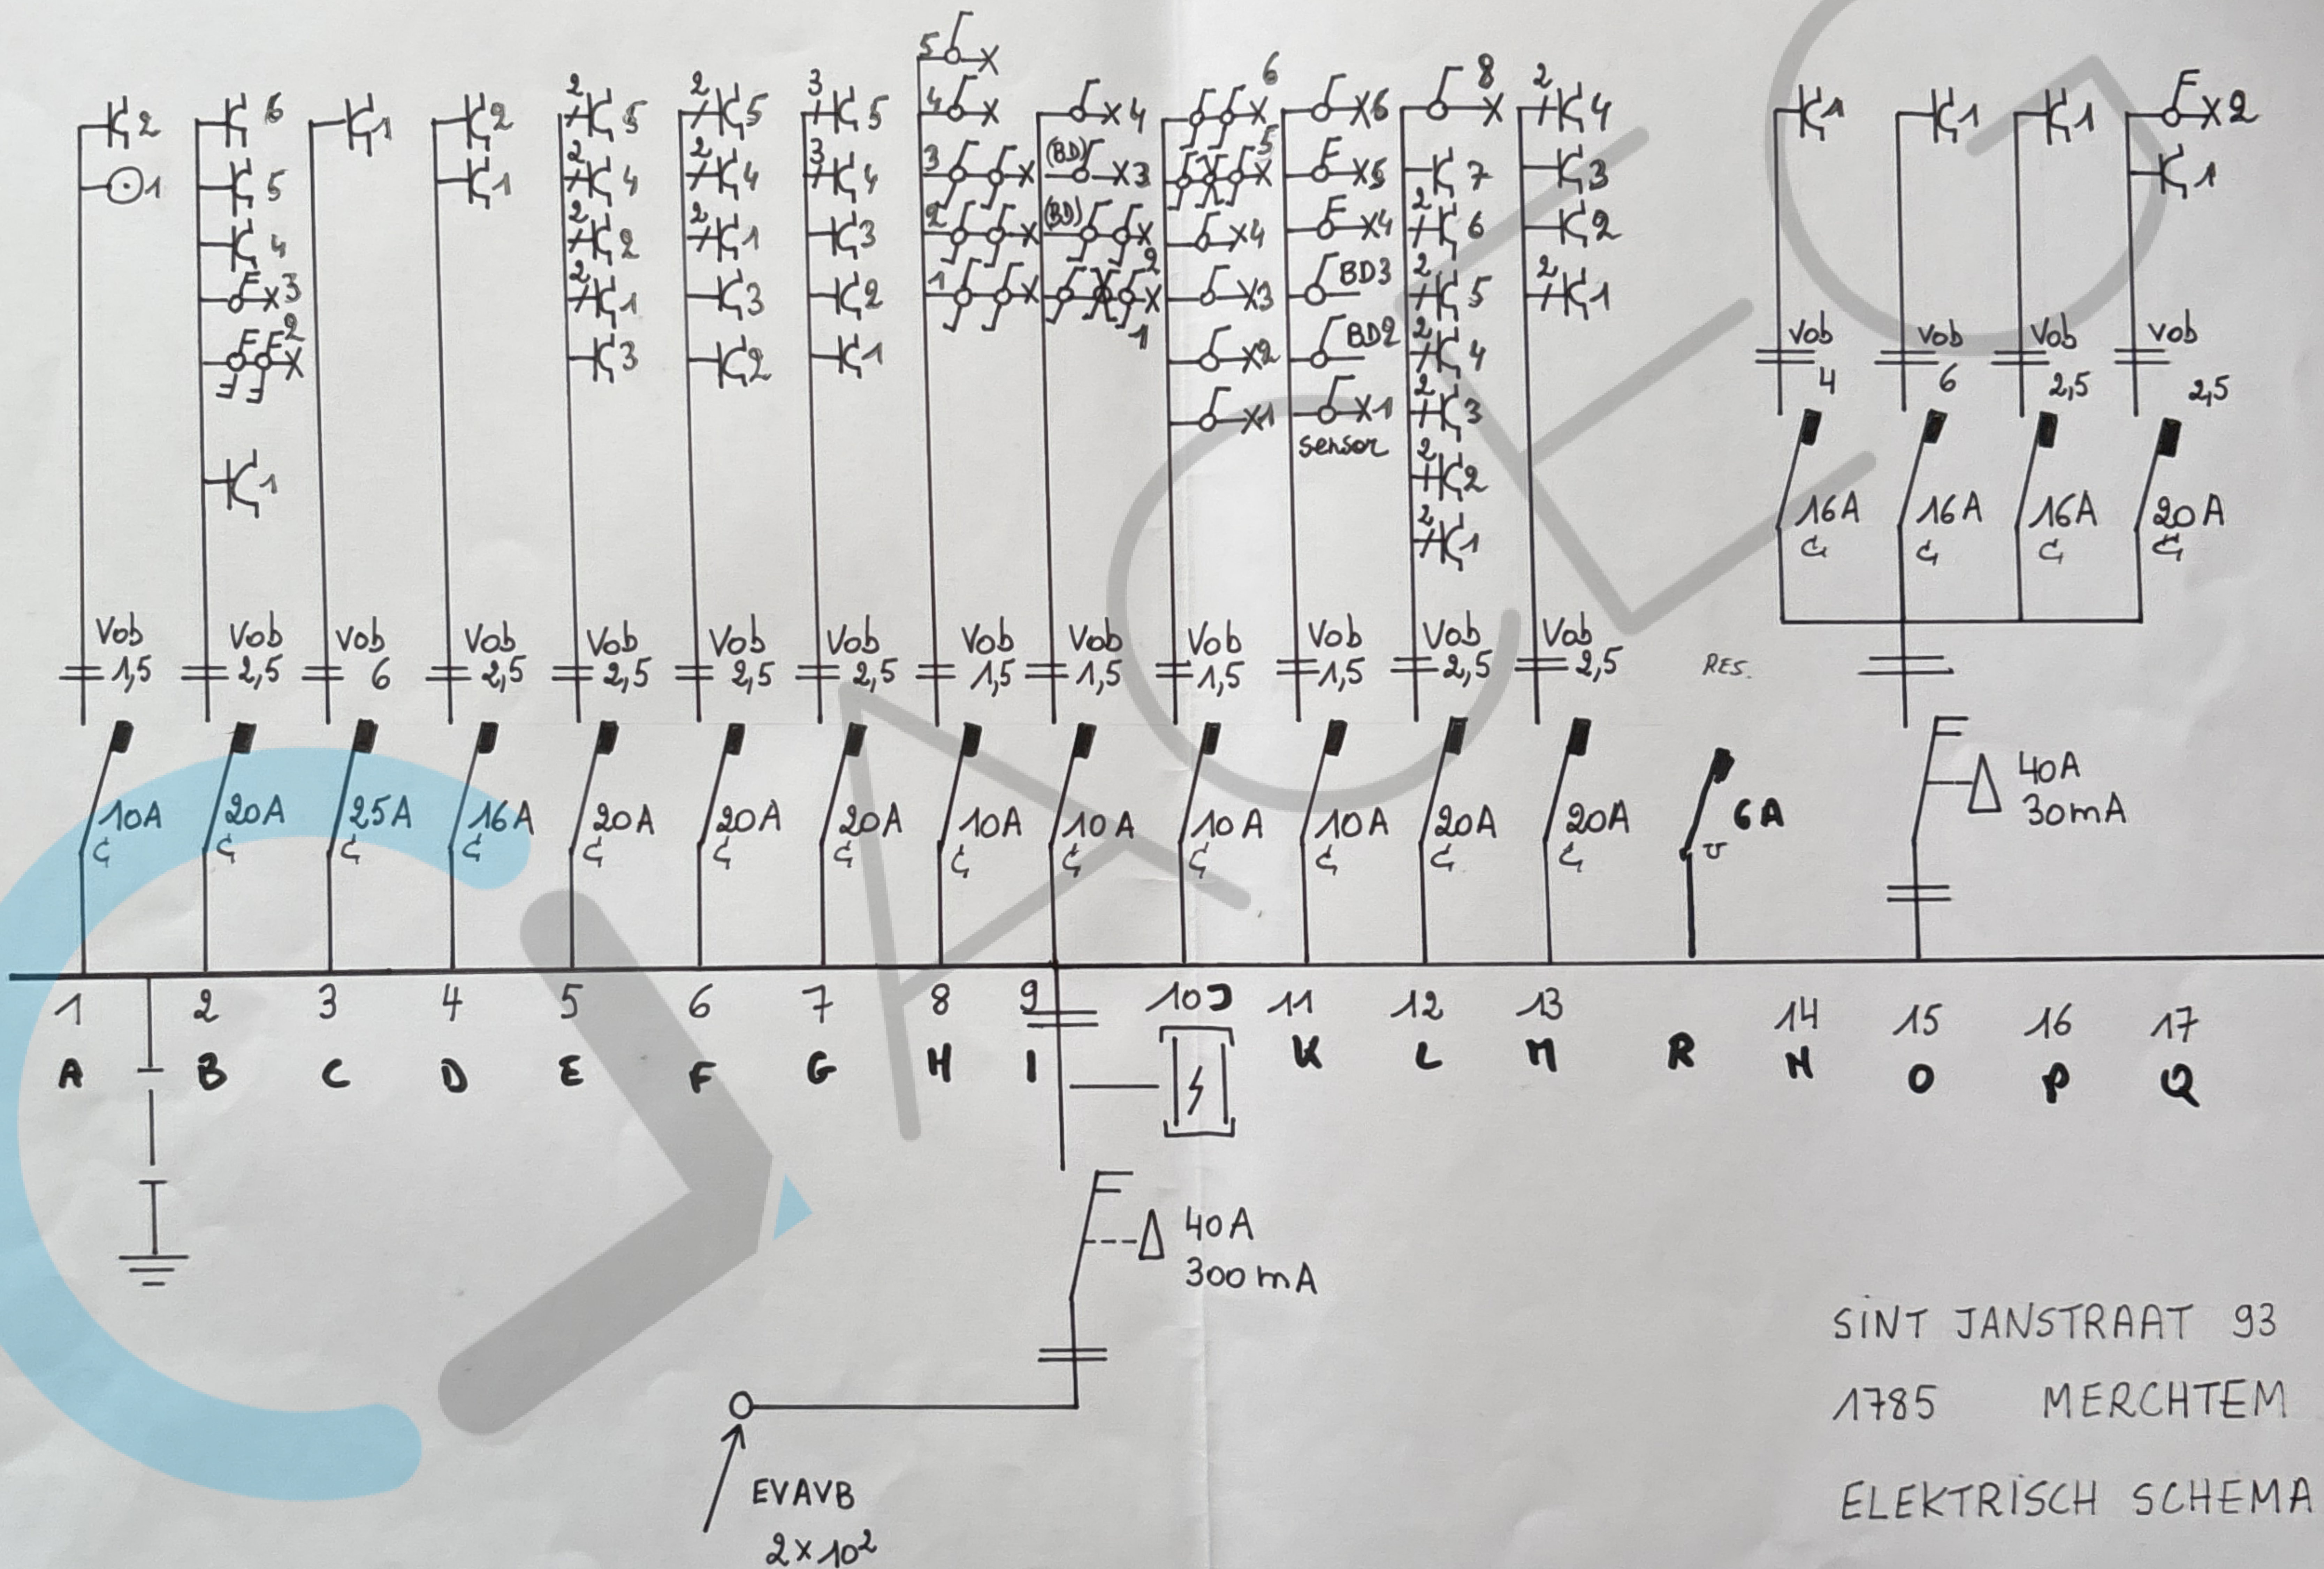

SINT JANSTRAAT 93
 1785 MERCHTEM
 ELEKTRISCH SCHEMA

Hand-drawn structural diagram of a rectangular frame. The diagram includes the following components and labels:

- Top Horizontal Member:** A single line representing a beam.
- Left Vertical Member:** A single line representing a column.
- Right Vertical Member:** A single line representing a column.
- Bottom Horizontal Member:** A single line representing a beam.
- Internal L-shaped Member (Top Right):** Labeled with "L 8" and "12/5 10 J 6".
- Internal L-shaped Member (Bottom Left):** Labeled with "X 12 L 8".
- Internal L-shaped Member (Bottom Center):** Labeled with "X 10 J 6".
- Internal L-shaped Member (Bottom Right):** Labeled with "X 10 J 6".
- Internal L-shaped Member (Bottom Left):** Labeled with "K 12 L 7".

AT 93

De Boekhoel
